

Dokumentation zur Erstellung eines Wurzelvorhanges an Platanen zur Vorbereitung eines Bauvorhabens an der Lessingstraße 66 in Recklinghausen

Auftraggeber: Vivawest Wohnen GmbH



Inhalt

1. Arbeitsauftrag	3
2. Arbeitsdurchführung.....	3
3. Dokumentation	3

1. Arbeitsauftrag

Die Vivawest Wohnen GmbH hat die Erstellung eines Wurzelvorhanges an einer Reihe Platanen in Recklinghausen gegenüber Lessingstrasse 66 an die HVG Grünflächenmanagement GmbH beauftragt.

Der Wurzelvorhang soll parallel im Abstand von ca. 1,90 zum noch vorhandenen Hochboard und in einer Breite von ca. 0,30 m erstellt werden. Die Tiefe des Wurzelvorhangs ist abhängig von dem vorzufindenden Wurzelwerk der Platanen. In der Regel soll dieser aber eine Tiefe von min. 1,70 m haben. Der Graben ist mit Hilfe eines Saugbaggers zu erstellen.

Nach Erstellung des Grabens sind die vorhandenen Wurzeln mit der Handsäge fachmännisch zu trennen. Im Anschluss sind die Wundstellen zum Baum mit Wundverschlussmittel zu versorgen. Danach ist zur geplanten Baugruben ein Geotextvlies an der Grabenwand einzubauen. Im Anschluss ist der Graben wieder mit einem Gemisch aus Lava und gelösten Boden im Verhältnis 1:4 zu verfüllen.

2. Arbeitsdurchführung

Die Arbeiten wurden durch die HVG Grünflächenmanagement GmbH in der Zeit von 02.07.2019 bis zum 05.07.2019 ausgeführt.

3. Dokumentation



Bild 1



Bild 2



Bild 3

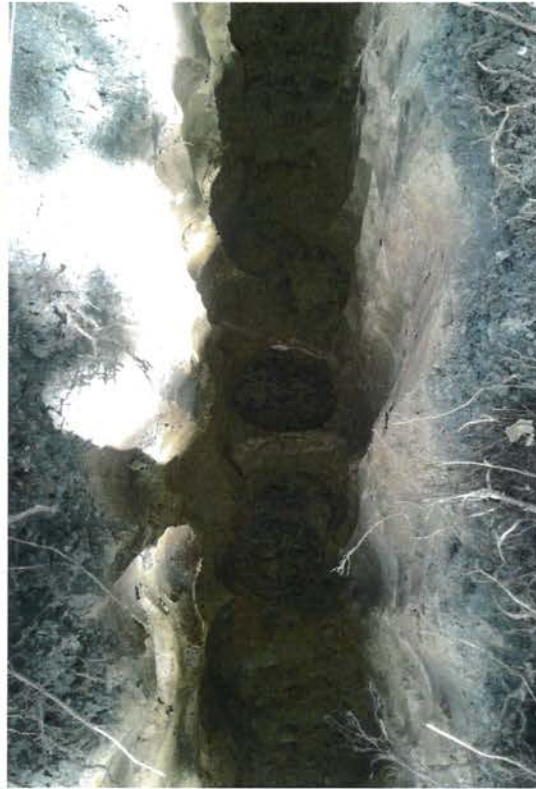


Bild 4



Bild 5



Bild 6


 **HVG**
Grünflächenmanagement
HVG Grünflächenmanagement GmbH
Andreas Hurtiennes Glückstraße 35
45896 Gelsenkirchen
Tel: +49 (0)209-35975-400

Das Dokumentation enthält ⁷..... Seiten.

Anlagen:

Plan 3x Punkthaus 14+14_TG LAgeplan Wurzelschutz

Plan 3x Punkthaus 14+14_TG LAgeplan Wurzelschutz Detail

